PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-5

Fase 3 · Analisis Kebutuhan



Kelompok · Kelas

Kelompok 2 · 4KA22

Proyek · Klien

Website Penjualan dan Pembukuan RAN Partner · Resta Apriyono

Pelapor · Tanggal

Fauziah Azzahrah Indah Sausan · [26-10-2026]

Anggota Kelompok

1. Fauziah Azzahrah Indah Sausan (10123442)
2. Farrah Assyifa Ramadhini (10123419)
3. Boas Rafael Siagian (10123254)
4. Robby Tri Ardianto (11123205)
5. Fahrial Febrian (10123399)



Status proyek minggu ini



STATUS KESELURUHAN

Sesuai jadwal

PROGRES RENCANA

29%

10 dari 35 tugas WBS dijadwalkan selesai

PROGRES REALISASI

34%

12 dari 35 tugas WBS selesai

Posisi pada peta 7 fase (pindahkan sorotan biru ke fase yang sedang berjalan)

Mg 1–2	Mg 3–4	Mg 5–6 · kini	Mg 7–8	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	**Desain**	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**

Milestone berikutnya: M3 SRS selesai · Minggu 6 · aman

Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
3.1	Pengumpulan data: wawancara dan observasi lanjutan	Farrah	30-10	✓ Selesai	Notulen W-02, O-02, D-01, D-02
3.2	Menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional	Farrah	30-11	✓ Selesai	Menyusun 27 KF & 11 KNF
3.3	Spesifikasi kebutuhan dan prioritas (MoSCoW)	Farrah	01-11	✓ Selesai	27 KF dan 11 KNF (draf)
3.4	Pemodelan kebutuhan: use case dan user story	Farrah	01-11	✓ Selesai	12 UC dan 12 US (draf)
3.5	Dokumentasi analisis (SRS)	Farrah, Fahrial	02-11	Revisi	Draf v1.0, klien belum menyetujui

Selesai 3 dari 5 tugas


Status: ✓ Selesai · Terlambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)

Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

- [SRS V1.0] – [draf] – [repo]
- Daftar Kebutuhan: 27 KF, 11 KNF (SRS Bagian 4.1 dan 5)
- 12 Use Case beserta spesifikasi dan 12 User Story (SRS Bagian 4.1-4.2)
- Prioritas MoSCoW , rencana rilis, matriks keterlacakan (SRS Bagian 8-9)
- Notulen Wawancara W-02 dan bukti dokumen klien (SRS Lampiran A)

Tunjukkan bukti, bukan klaim: tautan, nomor halaman, atau commit.

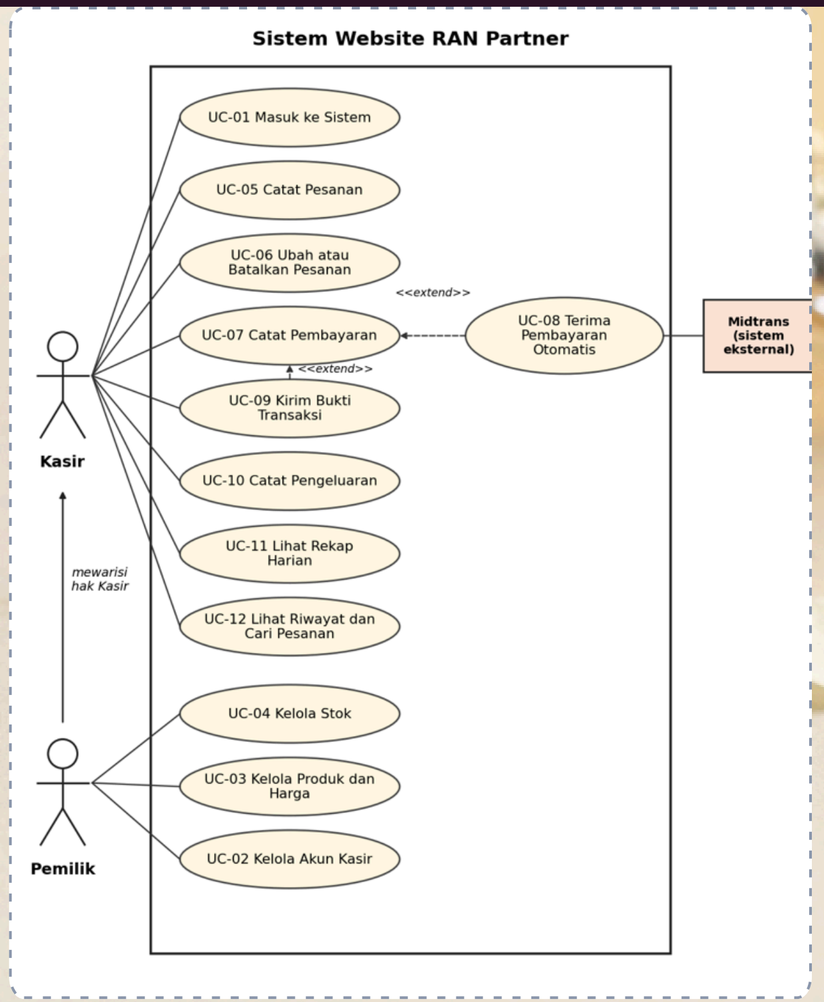

Kontribusi anggota

Nama	Peran	Pekerjaan minggu ini (kode WBS)	Jam
Fauziah Azzahrah Indah Sausan	Project Manager	0.1 memimpin rapat dengan klien (23-10), 0.2 memperbarui Gantt dan daftar risiko	1 Jam
Farrah Assyifa Ramadhini	System Analyst	3.1 wawancara dan observasi lanjutan, 3.2 dan 3.3 kebutuhan dan use case SRS	2 Jam
Boas Rafael Siagian	System Designer	Meninjau draf SRS sebagai bahan desain arsitektur dan wireframe (4.1 dan 4.3)	2 Jam
Robby Tri Ardianto	Programmer	3.1 pedoman wawancara, 3.2 dan 3.3 draf KF, KNF, use case, user story, 3.4 draf SRS	2 Jam
Fahrial Febrian	Tester	Meninjau draf SRS untuk bahan skenario uji (6.1 dan 6.2)	2 Jam
Fahrial Febrian	Technical Writer	3.4 merapikan format SRS dan lampiran, 2.5 dokumentasi perencanaan	1 Jam

Acuan beban: ±8 jam per orang per minggu (4 SKS = 180 jam per semester). Pekerjaan setiap anggota menjadi dasar peer assessment Minggu 6, 8, dan 13.

Komunikasi dengan klien

Pertemuan

23 Oktober 2026 · Daring via Google Meet
Hadir : Bapak Resta Apriyono, Fauziah (pewawancara) dan anggota tim

Yang dibahas

Wawancara lanjutan W-02: alur pencatatan pesanan, stok per aroma, pembayaran tempo dan sebagian, deteksi pembayaran otomatis, pengiriman, dan bukti transaksi

Masukan dan keputusan klien

- Prioritas utama adalah kontrol stok produk dan rekap harian.
- Sistem perlu mencatat aroma, jumlah botol, harga jual, dan keuntungan.
- Kasir berfokus pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran sesuai pesanan.

Perubahan kebutuhan

Ada 7 kebutuhan di luar RD v1.0 (stok, pengeluaran dan untung, status tempo dan PO +Rp5.000, QRIS dan transfer, Midtrans, rekap untuk kasir, data penyerahan).
Dampak: SRS sudah diperbarui Gantt dan biaya perlu dinilai.
Disetujui: belum

Kendala dan risiko

ID	Kendala / risiko	Dampak	Tindakan	PIC
R-02	Lingkup melebar (stok, pengeluaran, Midtrans)	Tinggi	Catat di SRS 3.4, minta persetujuan klien, Must dikerjakan dulu	PM
R-09	Tarif dan akun Midtrans belum jelas	Sedang	Konfirmasi ke klien Minggu 5 sampai 6	SA
R-13 (baru)	Data klien belum lengkap (aroma, modal, paket box)	Sedang	Minta ke klien lewat WhatsApp sebelum Minggu 6	SA
R-15 (baru)	Integrasi Midtrans untuk pembayaran otomatis belum terkonfirmasi	Tinggi	Konfirmasi kesiapan akun dan API Midtrans bersama klien sebelum implementasi	PM

Rencana minggu depan

Kode WBS	Tugas	PIC	Target
3.4	Finalisasi SRS: isi tanggal W-02 dan O-02, lengkapi dokumen yang menyusul	Farrah, Fahrial	02-11
3.4	Review SRS bersama klien dan tanda tangan persetujuan (Lampiran B)	Fauziah	30-10
R-09	Konfirmasi tarif Midtrans	Fauziah, Farah	30-10

JATUH TEMPO

SRS V2

Minggu 6 · 02-11-2026

Pertemuan klien: belum dijadwalkan, diusulkan awal Minggu 6
