PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-7

Fase 4 · Desain Sistem



Kelompok · Kelas

Kelompok 2 · 4KA22

Proyek · Klien

Website Penjualan dan Pembukuan RAN Partner · Resta Apriyono

Pelapor · Tanggal

Fauziah Azzahrah Indah Sausan · 09-11-2026

Anggota Kelompok

1. Fauziah Azzahrah Indah Sausan (10123442)
2. Farah Assyifa Ramadhini (10123419)
3. Boas Rafael Siagian (10123254)
4. Robby Tri Ardianto (11123205)
5. Fahrial Febrian (10123399)



Status proyek minggu ini



STATUS KESELURUHAN

Sesuai jadwal

PROGRES RENCANA

43%

15 dari 35 tugas WBS dijadwalkan selesai

PROGRES REALISASI

46%

16 dari 35 tugas WBS selesai

Posisi pada peta 7 fase (pindahkan sorotan biru ke fase yang sedang berjalan)

Mg 1–2	Mg 3–4	Mg 5–6 · kini	Mg 7–8	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	**Desain**	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**

Milestone berikutnya: M4 SDD selesai · Minggu 7 · aman

Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
4.1	Desain arsitektur sistem	Boas	15-11	✓ Selesai	arsitektur 3 lapis, MySQL, diagram penerapan
4.2	Desain proses bisnis dan basis data	Boas, Robby	15-11	✓ Selesai	12 activity diagram, ERD 10 tabel, kamus data
4.3	Wireframe	Boas	15-11	✓ Selesai	layar dan sitemap
4.4	Persiapan lingkungan pemrograman	Robby	15-11	Belum	Belum dimulai, acuan SDD Bag. 3 dan 5
4.5	Dokumentasi desain (SDD)	Boas, Fahrial	15-11	Belum	draf v1.0, menunggu review tim dan klien

Selesai 3 dari 5 tugas


Status: ✓ Selesai · Terlambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)

Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

- •SDD v1.0 lengkap Bagian 1 sampai 7 (draf), menunggu review
- •Arsitektur, penerapan, dan interaksikomponen (SDD Bag. 3.1 sampai 3.4)
- •Activity diagram 12 use case (SDD Bag. 4.2)
- •ERD, skemarelasional, dan kamus data 10 tabel (SDD Bag. 5)

Tunjukkan bukti, bukan klaim: tautan, nomor halaman, atau commit.

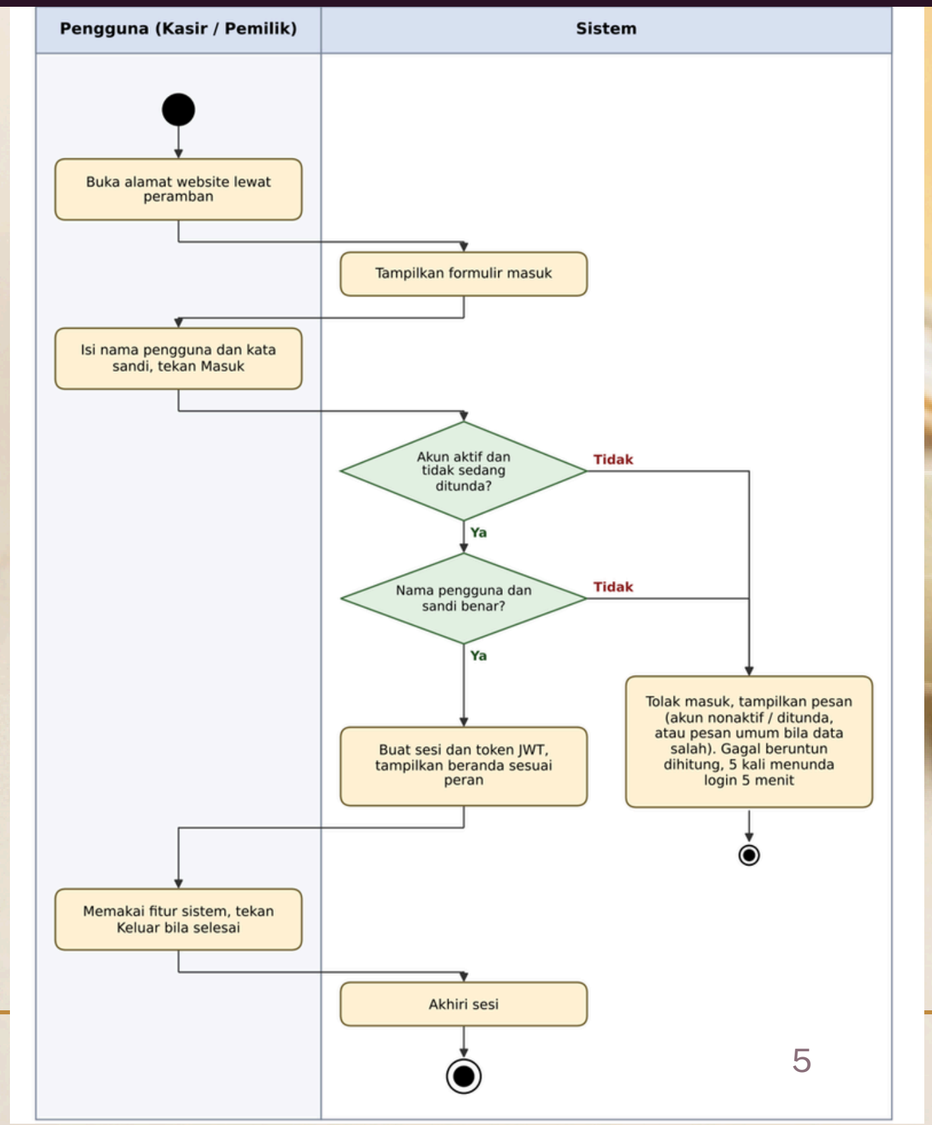

Kontribusi anggota

Nama	Peran	Pekerjaan minggu ini (kode WBS)	Jam
Fauziah Azzahrah Indah Sausan	Project Manager	0.2 memperbarui Gantt (Fase 3 Selesai), daftar risiko dan menyusun laporan progres	1 Jam
Farrah Assyifa Ramadhini	System Analyst	4.2 Meninjau SRS untuk desain (KF, Use Case dan entitas data)	2 Jam
Boas Rafael Siagian	System Designer	4.3 Wireframe / Mockup, dan rancangan antarmuka; arsitektur dan basis data	2 Jam
Robby Tri Ardianto	Programmer	4.4 Meninjau desain sebagai bahan sprint 1 dan menyiapkan lingkungan program	2 Jam
Fahrial Febrian	Tester	Meninjau draf SDD untuk bahan skenario uji (6.1 dan 6.2)	2 Jam
Fahrial Febrian	Technical Writer	4.5 Menyusun dan merapikan format SDD	1 Jam

Acuan beban: ±8 jam per orang per minggu (4 SKS = 180 jam per semester). Pekerjaan setiap anggota menjadi dasar peer assessment Minggu 6, 8, dan 13.

Komunikasi dengan klien

Pertemuan

Belum ada pertemuan klien minggu ini
Pertemuan review SDD direncanakan minggu 8

Yang dibahas

Review rancangan SDD: proses bisnis, struktur dan daftar
Wireframe / Mockup layar

Masukan dan keputusan klien

Belum ada masukan dan keputusan klien pada minggu ini

Perubahan kebutuhan

Tidak ada perubahan kebutuhan minggu ini
Dampak: Desain mengacu pada pada SRS: 27 KF, 11 KNF dan 12 UC
Disetujui: belum

Kendala dan risiko

ID	Kendala / risiko	Dampak	Tindakan	PIC
R-13 (baru)	Data klien belum lengkap (aroma, modal, paket box)	Sedang	Minta ke klien lewat WhatsApp	SA
R-16 (baru)	Stok aroma berisiko tidak sesuai dengan stok aktual.	Tinggi	Pastikan stok diperbarui setiap transaksi.	Programmer
R-17(baru)	Pembayaran tempo/bertahap berisiko tidak tercatat akurat.	Tinggi	Pastikan pembayaran dan pelunasan tercatat.	Programmer

Rencana minggu depan

Kode WBS	Tugas	PIC	Target
4.1	Rancang arsitektur sistem (Web, basis data, hosting, midtrans)	Boas	09-11
4.2	Merancang proses bisnis dan basis data (ERD)	Boas	09-11
4.3	Membuat wireframe / mockup	Boas	09-11
4.4	Mulai menyiapkan lingkungan pemrograman	Robby	16-11
4.5	Software Design Description (SDD)	Boas, Fahrial	16-11

JATUH TEMPO

SDD v1.1

Minggu 8 · 16-11-2026

Pertemuan klien: belum dijadwalkan, diusulkan awal Minggu 8
